ALLEGATO "A"

Comune di Cogorno
Provincia di Genova

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di nuovo edificio "Portale del Parco"

COMMITTENTE: Comune di Cogorno.

CANTIERE: Corso IV Novembre 115, Cogorno (Genova)

Cogorno, 21/11/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____
(Geometra Palomba Francesco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____
(Geometra Ratto Davide)

Geometra Palomba Francesco
Via Case Lunghe 11 int. 2
16042 Carasco (Genova)
Tel.: 3485736156 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: geom.francescopalomba@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g
Realizzazione della viabilità di cantiere	4 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	4 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	4 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	31 g
Impianti di servizio del cantiere	4 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	4 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4 g
Protezione delle linee elettriche aeree	4 g
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicur	4 g
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o sp	4 g
BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI	4 g
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni l	4 g
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigi	4 g
Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordign	4 g
Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni be	4 g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di b	4 g
Scavi di sbancamento	10 g
Scavo di sbancamento	10 g
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti	10 g
Scavo di sbancamento in terreni coerenti	10 g
Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mezzi meccar	10 g
Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mine)	10 g
Strutture in fondazione in c.a.	7 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda	7 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in f	7 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	7 g
Strutture in elevazione in c.a.	14 g
Primi pilastri - Realizzazione della carpenteria per le str	14 g
Primi Pilastri - Lavorazione e posa ferri di armatura per	14 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	14 g
Solai in c.a.	10 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	10 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o	10 g
Tamponature	14 g
Realizzazione di tamponature	14 g
Intonaci e pitturazioni in facciata	37 g
Formazione intonaci esterni tradizionali	12 g
Tinteggiatura di superfici esterne	6 g
Serramenti	24 g

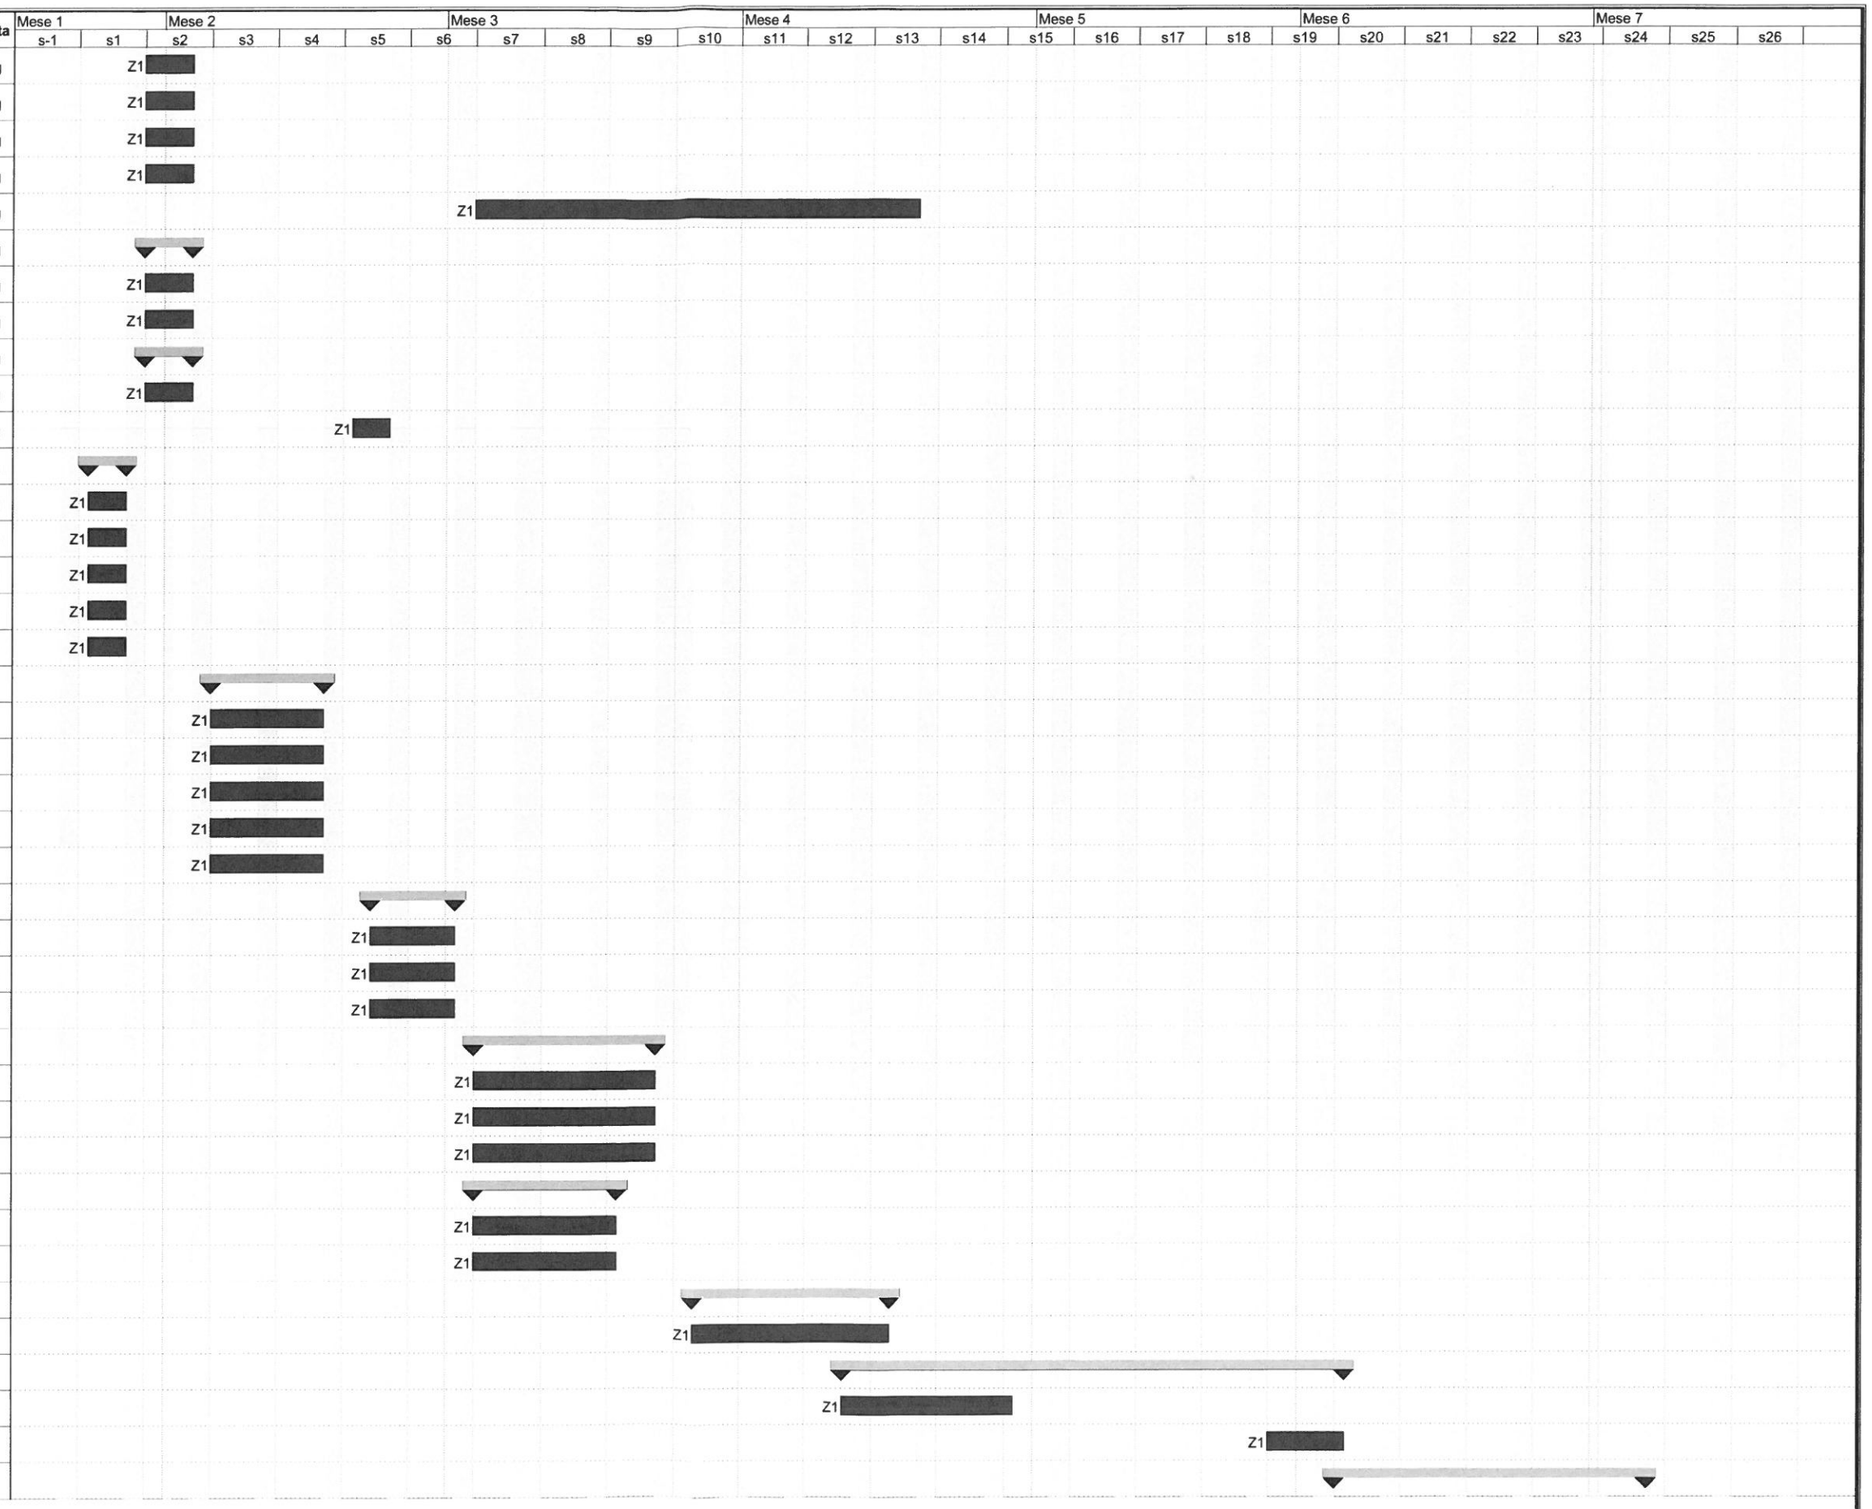

Nome attività	Durata
Montaggio di serramenti esterni	9 g
Montaggio di porte interne	4 g
Pareti divisorie, controsoffittature	40 g
Realizzazione di controsoffitti	5 g
Realizzazione di tramezzature interne	5 g
Isolamenti termici e acustici	47 g
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici vert	12 g
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici oriz	5 g
Intonaci e pitturazioni interne	55 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	11 g
Tinteggiatura di superfici interne	15 g
Massetti e sottofondi	5 g
Formazione di massetto autolivellante per pavimenti int	5 g
Pavimentazioni interne	5 g
Posa di pavimenti per interni in ceramica	5 g
Opere in legno e ferro	14 g
Posa di ringhiere e parapetti	5 g
Verniciatura a pennello di opere in ferro	5 g
Verniciatura a pennello di opere in legno	5 g
Posa di bambù per rivestimento	14 g
DISMISSIONE AMIANTO	4 g
Area di decontaminazione amianto	4 g
Realizzazione di un'area di decontaminazione de	4 g
Confinamento e incapsulamento amianto	4 g
Realizzazione di un confinamento artificiale delle	4 g
Incapsulamento di coperture in cemento amianto	4 g
Rimozione di manufatti contenenti amianto	4 g
Rimozione di coperture in cemento amianto	4 g
OPERE EDILI IN COPERTURA	55 g
Impermeabilizzazioni	5 g
Impermeabilizzazione di coperture	5 g
Impermeabilizzazione di balconi e logge	5 g
Opere di lattoneria	5 g
Montaggio di scossaline e canali di gronda	5 g
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	5 g
Pavimentazioni per coperture e balconi	5 g
Posa di pavimenti su balconi e logge	5 g
IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI	65 g
Assistenze murarie per impianti	10 g
Esecuzione di tracce eseguite a mano	10 g

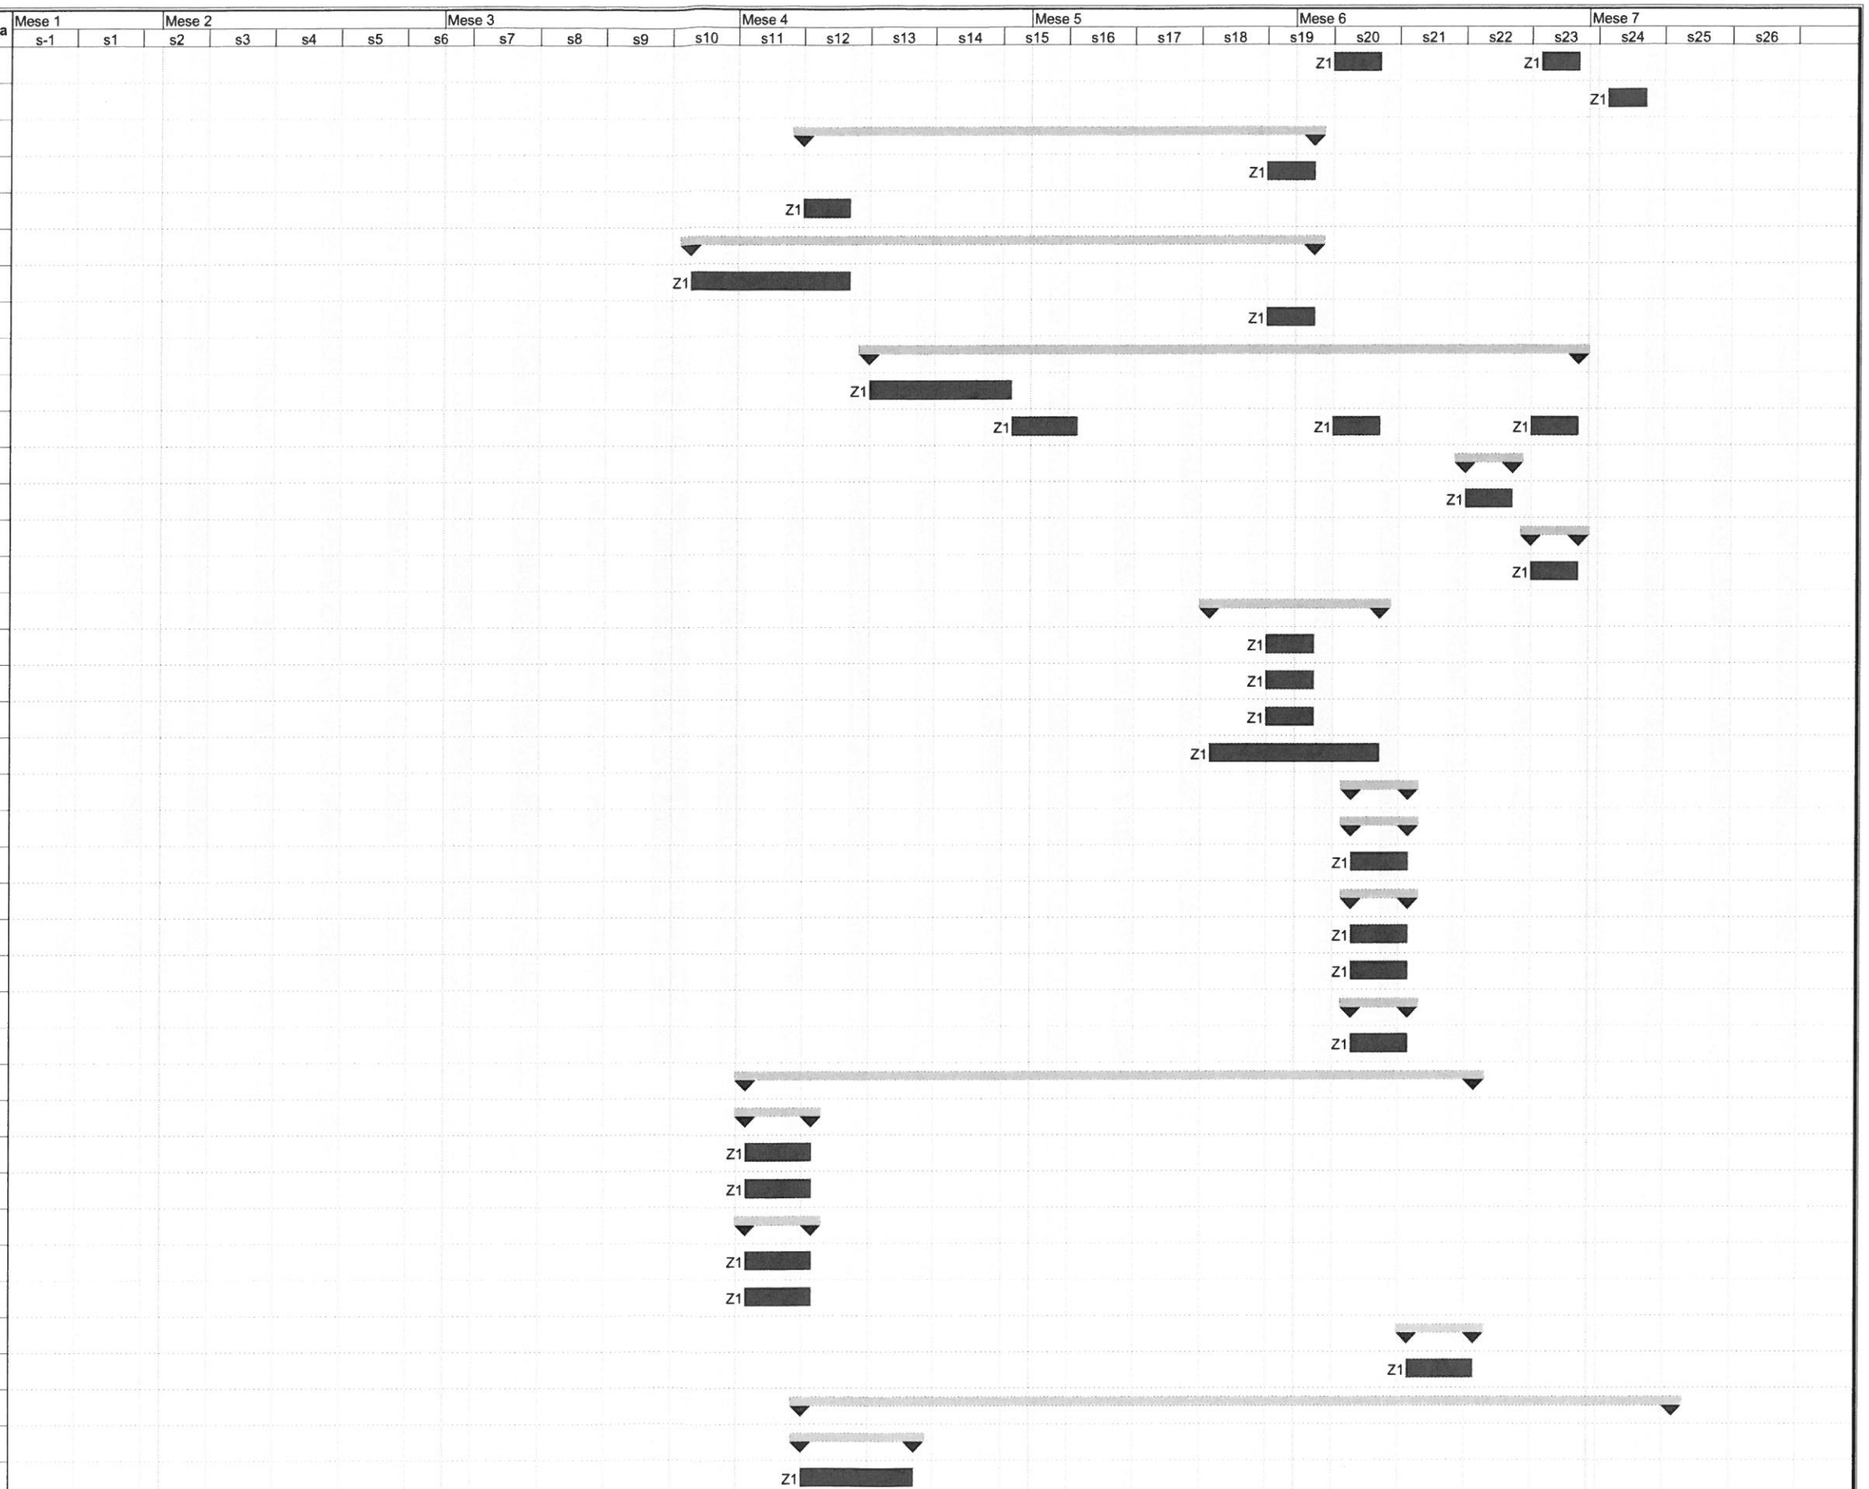

Nome attività	Durata
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi mecca	10 g
Impianti elevatori	4 g
Realizzazione di impianto servoscala	4 g
Impianti d'illuminazione	5 g
Installazione di corpi illuminanti	5 g
Impianti elettrici	43 g
Realizzazione di impianto elettrico	34 g
Impianti idrico-sanitario e del gas	64 g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	5 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impian	5 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impian	5 g
Impianti termici	10 g
Installazione di caldaia per impianto termico (auto	5 g
Realizzazione della rete di distribuzione e posa in	6 g
Impianto fotovoltaico	5 g
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	5 g
Montaggio di strutture reticolari in acciaio	5 g
Rinterri e rinfianchi	5 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	5 g
Scavi a sezione ristretta	5 g
Scavo a sezione ristretta	5 g
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI	8 g
DEMOLIZIONI	8 g
Demolizione di interi fabbricati con mezzi me	8 g
Demolizione di interi fabbricati con struttura	8 g
FOGNATURE	5 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	5 g
Smobilizzo del cantiere	36 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	5 g
Smobilizzo del cantiere	5 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g
Posa in opera di copertine in marmo	4 g

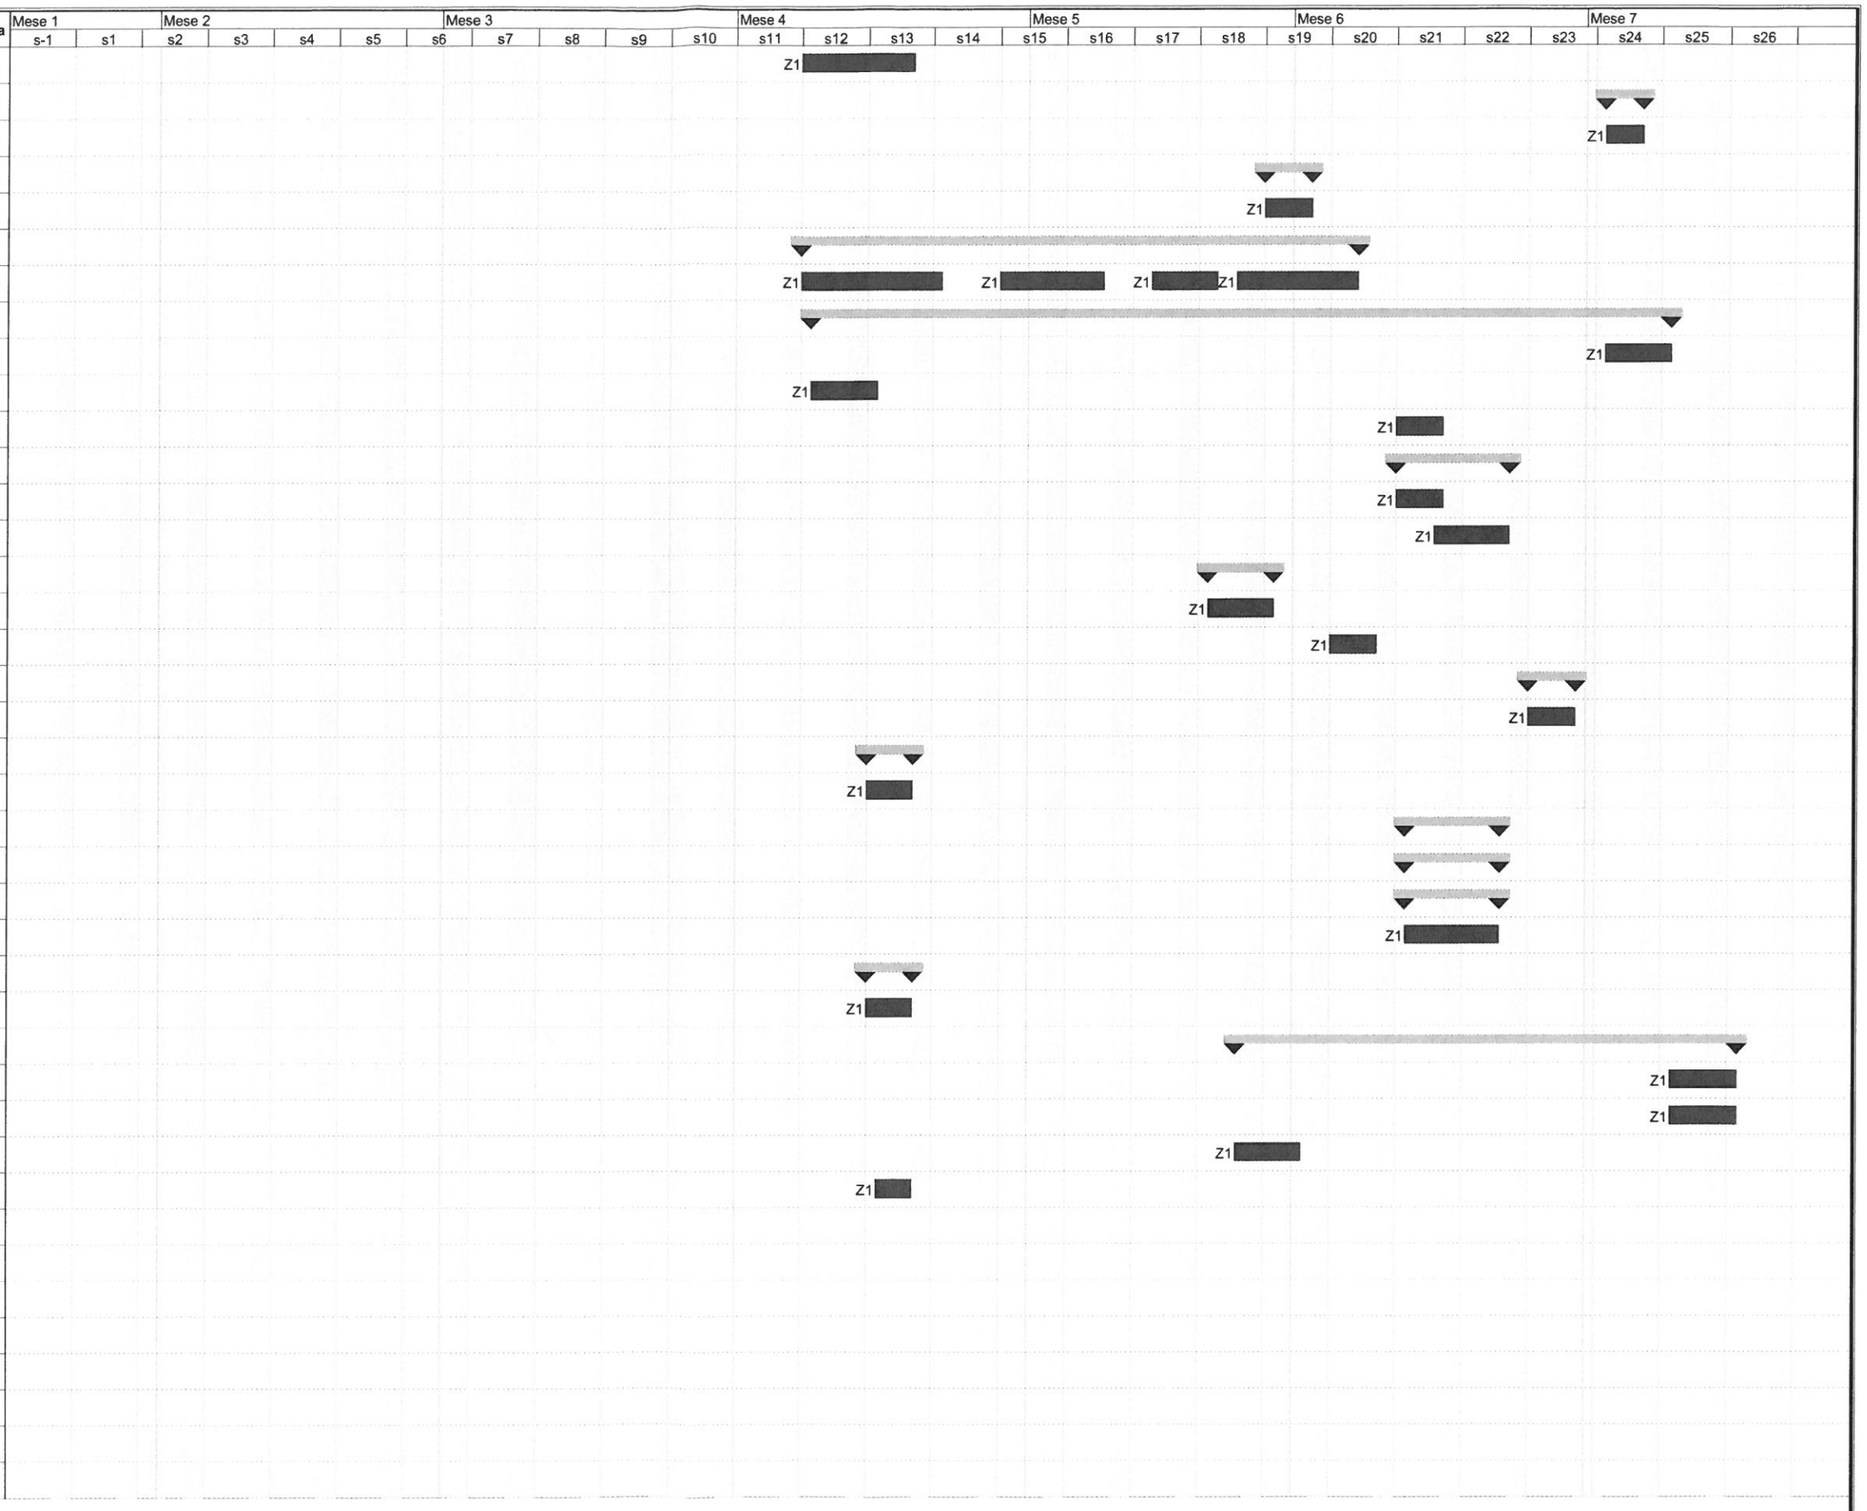

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
